

MOOREVITAL 2018 - Fortgesetzter Moorschutz im Erzgebirge

MOOREVITAL 2018 - pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách




Die Kooperationspartner / Kooperační partneři

- **LP – Staatsbetrieb Sachsenforst** (FoB Marienberg - Projektbüro)
- **PP1 – Lesy České republiky, s.p.** (Krajské ředitelství Teplice, LS Klášterec)
- **PP2 – Zweckverband Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“** (Außenstelle Pöbershau)
- **PP3 – Ústecký kraj** (Krajský úřad, Oddělení životního prostředí)
- **PP4 – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**
(Außenstelle Zwickau)




Das Sächsische Gebiet der Moorrevitalisierungen

Saské území revitalizací rašelinišť (162 ha)

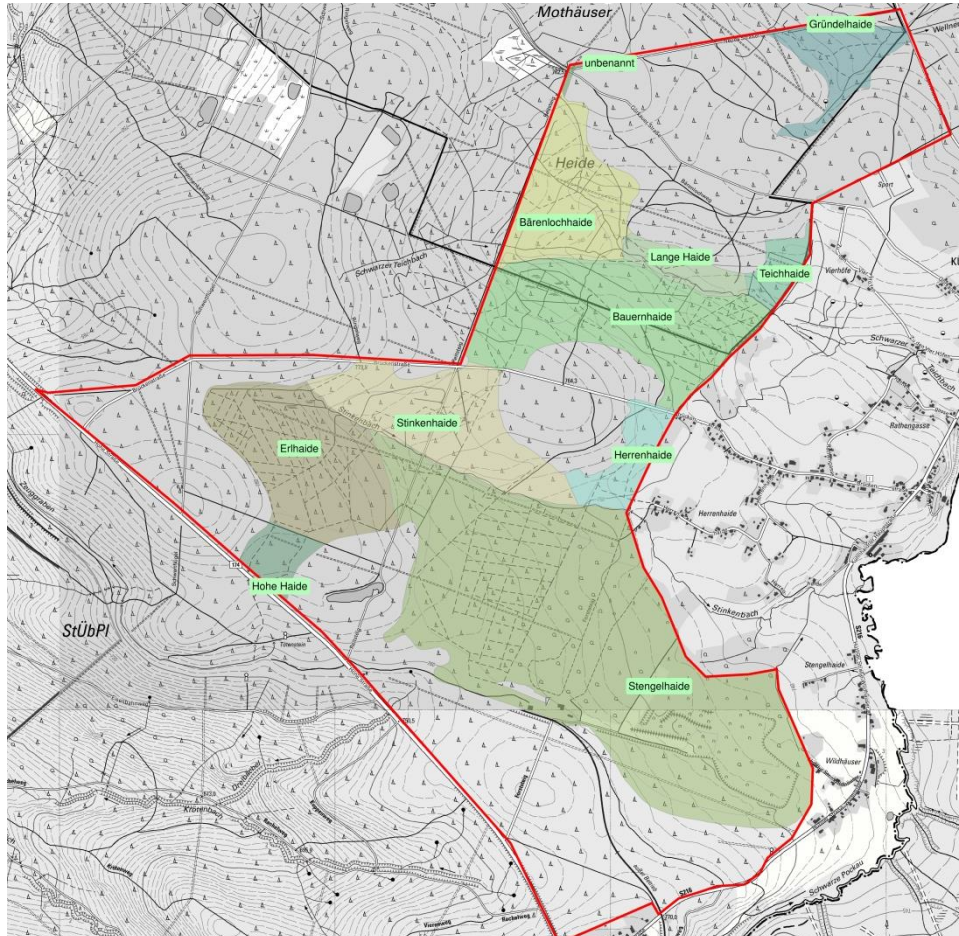

Das tschechische Gebiet České území (10 ha)

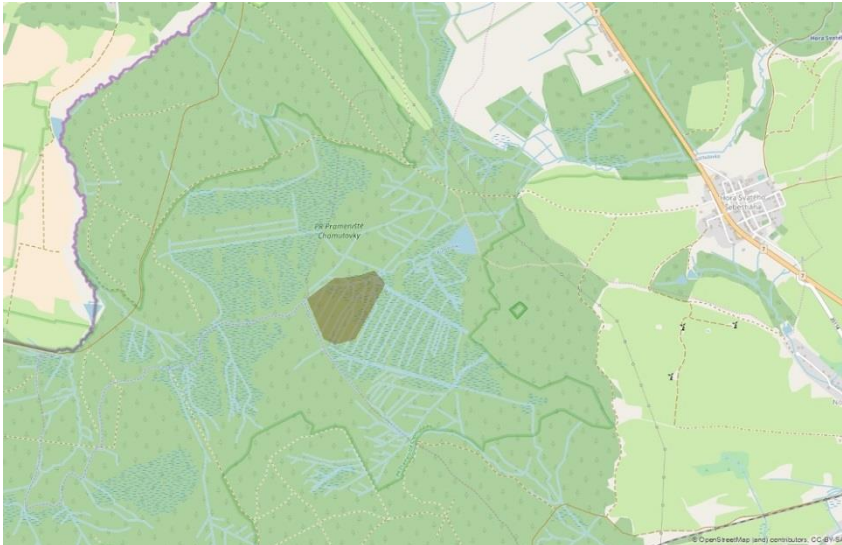

schrittweise Erfüllung der Projektaktivitäten / Postupné plnění projektových aktivit

- Projektvorbereitung und Antrag / Příprava a žádost: 2015 - 2017
- Zuwendungsvertrag / Smlouva o poskytnutí dotace: 05/2017
- Projektbüro / projektová kancelář: 09/2017 (voll besetzt / plně obsazeno)
- Erste Projektbegleitende Arbeitsgruppe / první doprovodná pracovní skupina:
01/2018 Pobershau (Vorstellung der Projektaktivitäten/ Představení projektových
aktivit)
- Projektpartnertreffen / Setkání projektových partnerů: 08/2017 Marienberg,
03/2018 Klášterec, 06/2018 Stengelhaide, 09/2018 Marienberg
- Luftbild- und Laserscan Befliegung / Pořízení leteckých a laserových snímků: 07-
08/2018
- Baumaßnahmen / Stavební opatření: ab / od 05/2018

Schrittweise Erfüllung der Öffentlichkeitsarbeit / Postupné plnění práce s veřejností

- Öffentlichkeitsarbeit / Práce s veřejností:
 - 9 Artikel / článků LP, NP, PP1 (Frühling/ Jaro 2019)
 - Website MOOREVITAL laufend aktualisiert (Neuigkeiten) / Webové stránky MOOREVITAL průběžně aktualizovány
 - 13 Führungen / provádění územím in 2018 (LP + PP2)
 - Wanderausstellung laufend verliehen bspw. / Putovní výstava průběžně v zápůjčce např. Ostrov, Kalek, Ústí/L.
 - wird 2019 erweitert / bude rozšířena 2019



Schrittweise Erfüllung der Revitalisierungen / Postupné plnění revitalizací

Verantwortlicher / Zodpovídá	Maßnahmenplanung / Plánovací dokumentace		Moorrevitalisierung / Revitalizace rašelinišť
PP1 Einzäunung und Aufforstung der Weiden und Einzäunung der Moorbirken / Zaplocení a výsadba vrb a oplocení břízy pýřité	2016	x	08-09/2018 10-11/2018, 2019
PP2	08/2017	x	05-07/2018
LP	11/2018	x	07-10/2019
Der Lehrpfad in der Stengelhaide bei der Kühnhaide wird qualitativ 2019 erneuert. Naučná stezka Stengelhaide u Kühnhaide bude kvalitativně obnove v roce 2019.			

Der Stand der Bauarbeiten / Stav stavebních prací

- deutsches Gebiet – 9 Moorkörper / německé území – 9 rašelinných těles:
 - 1 Moorkörper / těleso Stengelhaide – Grabennetz geschlossen / systém kanálů uzavřen (63 ha)
 - 8 Moorkörper / těles der Mothäuser Haide – im Stand der Vorbereitung / v přípravě (121 ha)
 - Baumentnahme / Odstranění stromů
 - Ausschreibung für Baumaßnahmen / VŘ pro stavební opatření
 - Bau / Stavba
- tschechisches Gebiet – 1 Moorkörper / české území 1 rašelinné těleso:
 - Novoveské rašeliníště – Grabennetz geschlossen / systém kanálů uzavřen (10 ha)
 - Dieses Jahr werden Weiden gepflanzt, die Moorbirke im Moor wird eingezäunt (gegen den Wildverbiss). Die Weiden und Birken bieten Nahrung für das Birkhuhn. / Tento rok budou osázeny vrby, bříza pýřitá v rašeliníšti chráněná plotem proti okusu zvěří. Vrby a břízy poskytují potravu tetřívkoví.

Grabenverschluss / Uzavření příkopu – Stengelhaide 06.06.2018



Stengelhaide füllt sich kurz nach der Baumaßnahme mit
Wasser / Stengelhaide se krátce po stavebním opatření plní
vodou



Grabenverschluss / Uzavření příkopu - Novoveské rašeliníště 07.08.2018




Novoveské rašeliniště – flächige Verfüllung / Plošné zahrnutí Herbst / podzim 2018




Befliegung der Projektgebiete / Letecké snímkování projektových území

- I Luftbilder wurden für das ganze grenzüberschreitende Gebiet für den LP von der Firma **BSF Swissphoto GmbH** hergestellt. Zur Erstellung einer abgesicherten Referenzdatenbasis für langfristige Beobachtungen wurden die Gebiete beider grenzübergreifender Projekte (insgesamt ca. 1.910 ha Größe) mit Laserscanner und digitalem Bildflug hoch aufgelöst (Bodenauflösung 0,05 m) aufgenommen.
- I Letecké snímky pro LP pořídila pro celé přeshraniční území firma BSF Swissphoto s.r.o. K vyhotovení referenční databáze pro dlouhodobé pozorování byly pořízeny laserové a letecké snímky s vysokým rozlišením (0,05 m na zemi) pro oba přeshraniční projekty (celkem cca 1910 ha)
- I ca. 800 Luftbildaufnahmen/ leteckých snímků
- I Die Luftbild- und Laserscandaten werden durch eine spezialisierte Firma nach einer vorgegebenen Methodik stereoskopisch ausgewertet (ca. 549 ha Moorkörper). / Data leteckého a laserového snímkování budou dle předložené metodiky stereoskopicky vyhodnoceny specializovanou firmou.

Laserscanaufnahme / Laserový snímek Stengelhaide 07/2018

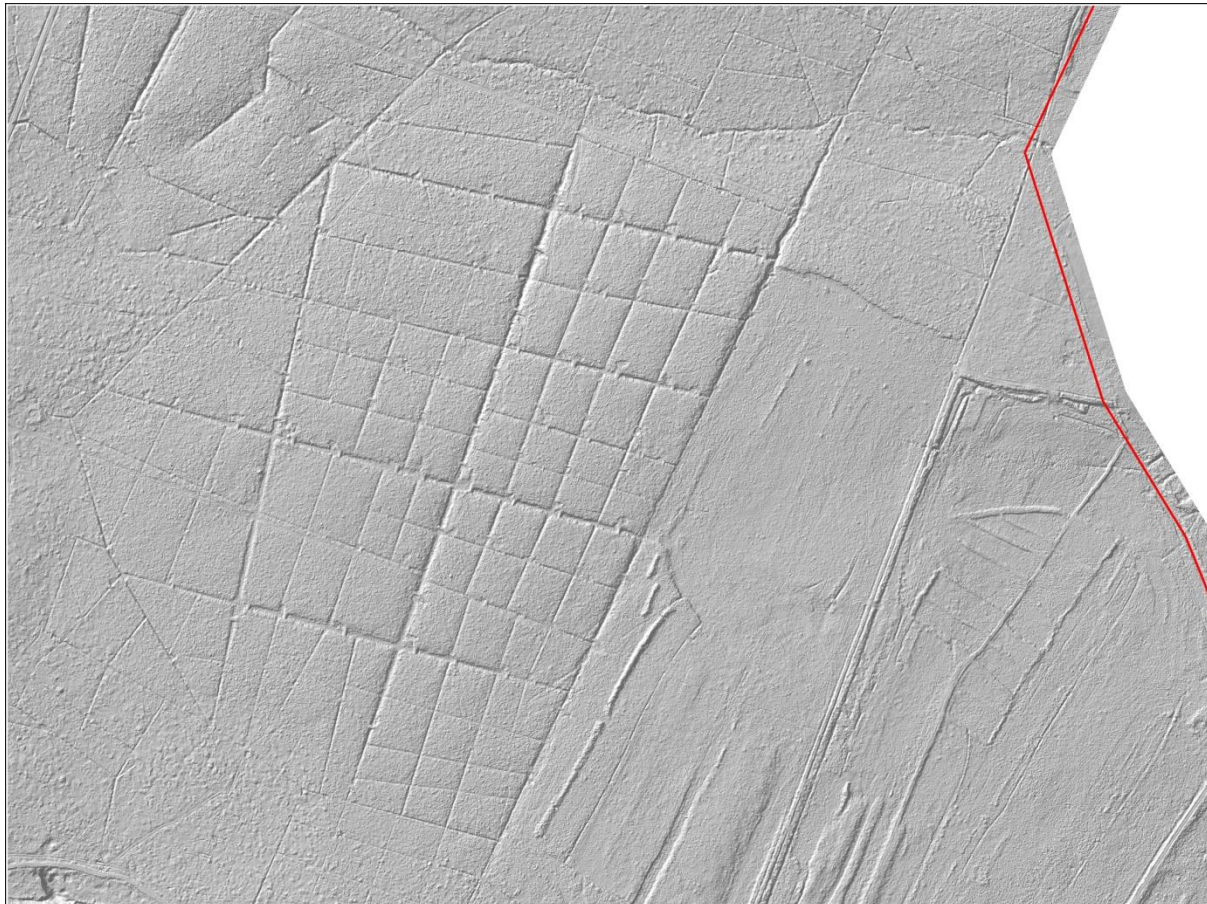

Arbeitsfeld des Leadpartners / Pracovní pole Leadpartnera

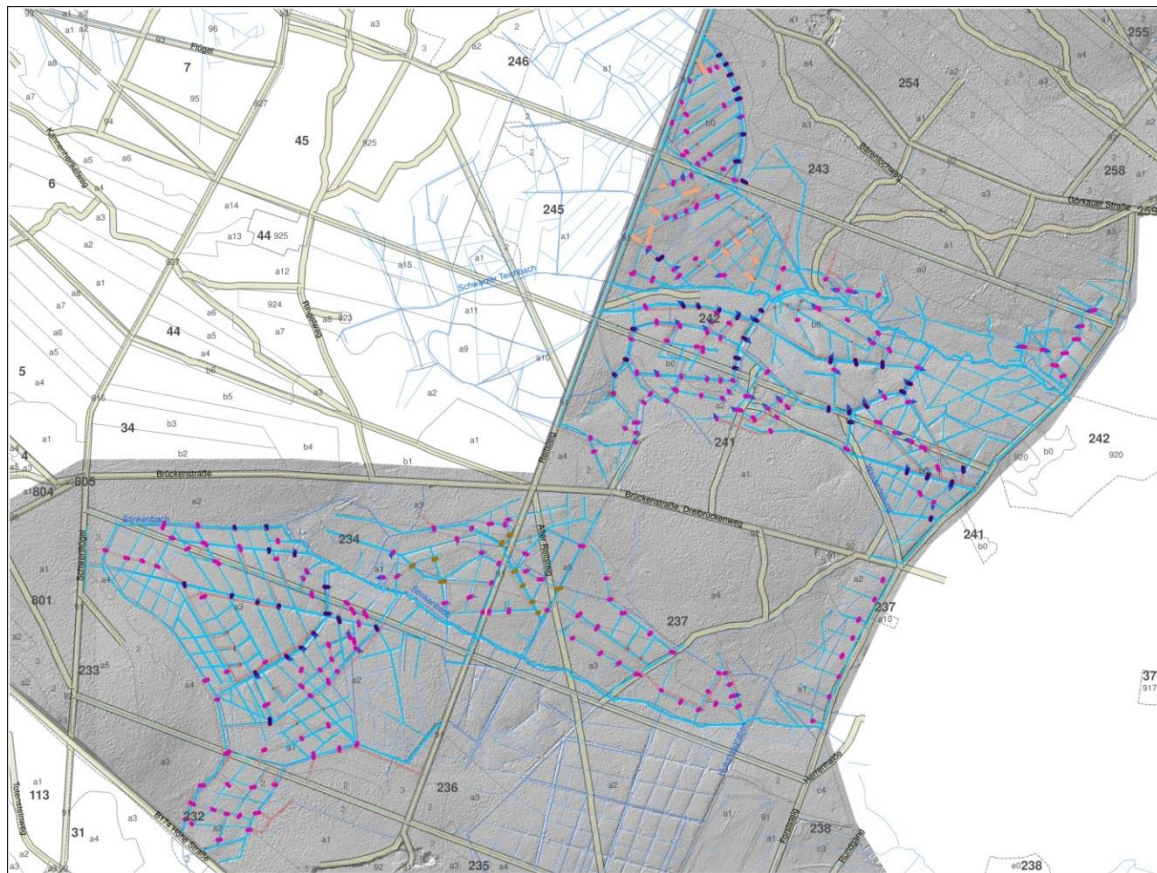

Maßnahmeplanung emc

- Nut-Federbrett-Spundwand (SW)
- Spundbohlendamm (SB)
- Stammholzarmierter Torfstau (RQ)
- Stammholzarmierter Torfstau mit Ausleitung RQa
- Torfstau mit Ableitung (V2a)
- Torfstau (V2), Ableitung nach Befund vor Ort
- Torfverfüllung längerer Grabenabschnitte (VL*)
- Ausleitung (zu RQa oder V2a)

Aktuelles beim LP / Aktuálně LP

- **Ab 12/2018 Einholung der notwendigen Genehmigungen** (Übergabe der hydrologischen Gutachten und Maßnahmenplanung an UNB, zwischenzeitlich die Auszeichnung der Stauwerke im Gelände und Holzentnahme)/ **Od 12/2018 získávání nutných povolení** (předávka hydrologického posouzení a plánovací dokumentace orgánu ochrany přírody, mezitím vyznačování přehrázek v terénu a těžby)
- **Entscheidung über die schonende Technologie** der Zuwegungen, Baumentnahmen, Maschinenarten, Seilanlagen, kleiner Forwarder oder Schlepper, Art des Kleinbaggers, händische Zuarbeit usw.) / **Výběr šetrné technologie** pro pojezdové trasy, odstranění stromů, druhy strojů, navíjecí systémy, malé vyvážedky nebo traktory, druh malých bagrů, ruční podíl prací atd.



Aktuelles beim LP/ Aktuálně LP

■ Aufgaben für 2019 / Úkoly pro 2019:

- Februar - März – Zuwegungen für Kleinbagger fertig stellen.
- únor – březen – zhotovit pojezdové trasy pro malý bagr
- April - Juni – Ausschreibung für Baumaßnahmen durchführen
- duben-červen – uskutečnění výběrového řízení na stavební práce
- Juli - Oktober – Stauwerke an Entwässerungsgräben herstellen
- červenec – říjen – postavit přehrázky na odvodňovacích kanálech



Meilensteine/ Milníky

Meilenstein	Befliegung / Letecké snímkování	H. Gutachten mit Maßnahmenplanung / Hydro-posudky, PD	30.09.2019 Moorlehrpfad / Naučná stezka	31.12.2019 Vegetationskartierung / Vegetační snímkování	31.12.2019 Revitalisierung der Moore / Revitalizace rašelinišť	31.03.2020 Moorbezogene Umweltbildung / Ekologická výchova o rašeliništích	Moor-Unter- suchungen CZ / Podklady k průzkumu rašeliniště	30.03.2020 Hydromonitoring CZ
KP								
LP	Juli 2018				Juli 2019 - Oktober 2019	Mai 2018 - Dezember 2019		
PP1 - LČR					August 2018 - Dezember 2019			
PP2 - NPV			Oktober 2019		Mai - August 2018			
PP3 - KUUL						Mai 2018 - Dezember 2019	Januar 2018 - Februar 2019	August 2018 - März 2020
PP4 - LFULG		November 2018		August 2018 - 31.12.2019				

Erreicht/dosaženo

laufend/probíhá

in Vorbereitung/v přípravě

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.



Děkuji Vám za pozornost.
